


KEURINGSRAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Agent-bezoeker **Benjamin Vanderhoeven** Datum controle **05-09-2025**
Rapportnummer **01-20250905-001-10CMG2E-Rev0**

Algemene gegevens

Adres installatie **Fabrieksstraat 12, 3200 Aarschot**
Controle volgens **AREI Boek 1 - Interne procedure tech01**
Type controle **Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (6.4)**
Afwijkingen/aanvullende hs **/**
Type installatie **Woonéénheid**
Eigenaar **Callaerts Jasper**
Adres eigenaar **Fabrieksstraat 12, 3200 Aarschot**
Installateur **Supcon BV BE1014093032**

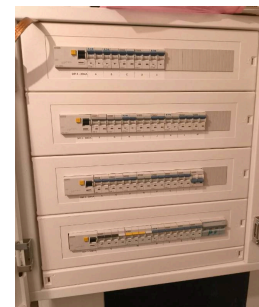

Installatie

Netbeheerder	Fluvius	Aardingsinstallatie	TT - pen/staaf
EAN-code	Niet bekend	Aantal verdeelborden	1
Tellernummer	1SAG3100601592	Aantal eindstroombanen	28
Nominale spanning (V)	3x400+N	Reservekringen	0
Nominale stroomsterkte (A)	25	Inom. hoofdschakelaar (A)	40
Voedingskabel hoofdbord (mm ²)	10	Δ Hoofddifferentieel (mA)	300

Controle / metingen / beproevingen

Aardingsweerstand (Ω)	8.58	Equipotentiale verbindingen	OK
Isolatiweerstand (MΩ)	0.77	Rechtstreekse aanraking	OK
Foutlus differentieel(s)	OK	Onrechtstreekse aanraking	OK
Testknop differentieel(s)	OK	Schema's / dossier	OK
Continuïteitsmeting	OK	Staat elektrisch materieel	OK

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene differentieelstroombeschermingsinrichting was/werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 6.5 van boek 1 uiterlijk voor 5-09-2050 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Agent-bezoeker: Benjamin Vanderhoeven



Beschrijving installatie

- Zie schema's voor de beschrijving van de installatie.

Opmerkingen

- Voor de plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater: zie AREI boek 1 onderafdeling 9.1.2.
- Bij het ontbreken/incorrect zijn van schema's tijdens de keuring is het mogelijk dat bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld en/of dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld tijdens de herkeuring.
- Toestellen/apparaten aangesloten op de vaste installatie maken geen deel uit van de controle.
- Het onderzoek beperkt zich tot de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie. (schakelaars, contactdozen, goten, plinten... werden niet geopend). Het sluit verborgen delen van de installatie (bv. achter valse wanden/plafonds, achter nissen...) uit.
- Op het moment van de keuring was het te onderzoeken inspectiegebied (deels) bemeubeld.
- De schema's zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.

Inbreuken

- Nihil

Raadgevingen

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:
 - a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
 - b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
 - c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
