



**VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE BIJ OVERDRACHT EIGENDOM A.R.E.I. Art. 271**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	13/05/2016	Verslag N°	PL/160513/03	Fac	2016-1483	ID	PL2016-570
* Adres installatie	HOEGAARDENSTRAAT 9 BUS 4 3300 TIENEN						
* Eigenaar of DNG	STRUYVEN – VANMOL						
* Opdrachtgever	IDEM						
* Installateur	IDEM				BTW / IK	-	
* DNB	EANDIS	EAN Ref.	-				
* Teller N°	Nvt	Index dag	-			Index nacht	-
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
230	Algemene gebouw > 30 Ohm	10	Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\varnothing$	Borden	Eind - stroombanen
Max. 40 A	40A/300mA	4 x 10mm ²	1	8
Begin der werken	Funderingen	Voor	Na	01/10/1981
	Installatie	Voor	Na	01/10/1981

2.- CONTROLEBEZOEK conform het K.B. van 25/06/2008

Het controlebezoek heeft tot doel de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te stellen met:
- De voorschriften van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (A.R.E.I.) die erop betrekking hebben.

Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) , huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie ZIE SCHEMA'S

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

3.1.- GEEN

4.- BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).
De volgende controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn uiterlijk 25 jaar na datum van het verslag alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. - Het (de) één draadschema (s) werd (en) gevisceerd.
- ~~De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (A.R.E.I.).~~
~~De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogerdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~
~~Een aanvullend bezoek moet door A'S'C worden uitgevoerd uiterlijk op 12 maanden na datum van het verslag.~~

De inspecteur
Naam + Code
LASSAUT PIERRE (PL)

Vr. De directeur,

5.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkinstructie E006 op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van huishoudelijke elektrische installaties

- | | |
|-------|--|
| 5.- a | Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's. |
| 5.- b | Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen |
| 5.- c | Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking |
| 5.- d | Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting |
| 5.- e | Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat. |
| 5.- f | De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I |
| 5.- g | Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen |
| 5.- h | Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen |

- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.

6.- PLICHTEN VAN DE VERKOPERS EN KOPERS - K.B. VAN 25/06/2008 IN VOEGE VANAF 01/07/2008

- | | |
|-------|--|
| 6.- a | Art.- 4: dit besluit is van toepassing op:
1°- verkopen uit de hand waarvan de onderhandse verkoopsovereenkomst wordt gesloten na inwerkingtreding van dit besluit.
2°- openbare verkopen waarvan de verkoopvoorwaarden worden opgesteld na inwerkingtreding van dit besluit en op voorwaarde dat de eerste zitdag minstens één maand na de inwerkingtreding van dit besluit plaats vond. |
| 6.- b | Artikel 276 bis.02 van het A.R.E.I.
a.- Verplichtingen:
Bij de verkoop van een wooneenheid als bedoeld in art.276bis.01 is de verkoper verplicht:
- een controlebezoek van de elektrische installatie te laten uitvoeren;
- de datum van het proces-verbaal van het controlebezoek en het feit van de overhandiging van dit proces-verbaal in de authentieke akte te doen vermelden.
- indien de verkoper en koper overeenkomen dat het controlebezoek van de elektrische installatie overbodig en nutteloos is omdat de koper het gebouw gaat afbreken of de elektrische installatie volledig gaat renoveren is de verkoper verplicht dit akkoord in de authentieke akte te doen vermelden.

- De verkoper is verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Algemene Directie Energie, afdeling Infrastructuur schriftelijk moet informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. Deze laatste maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem haar een proces-verbaal van controle toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen.

- In het geval van onmogelijkheid om de controle te laten uitvoeren bij een door gerechtelijke beslissing bevolen verkoop is diegene die de verkoop vordert verplicht in de authentieke akte of in het proces-verbaal van openbare toewijzing de afwezigheid te doen vermelden van het controlebezoek van de elektrische installatie en het belang van de koper om tot deze controle te laten overgaan.


- In het geval van een controlebezoek met een negatief proces-verbaal als gevolg, is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mede te delen aan het erkend- organisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

- Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen voor een nieuw controlebezoek om na te gaan of na de afloop van een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de overtredingen verdwenen zijn.

- Deze controle moet worden uitgevoerd door hetzelfde organisme |
| 6.- c | Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A”S”C |

Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. **overdracht eigendom** en voor **geen** enkel ander doel (bv. verzwaring van de aansluiting of andere verplichte controle 's).

Autonome Security Controle VZW – Maatschappelijke zetel – Ketelstraat, 111 – 3454 Rummen
BTW : BE 0826-131-776 – Tel. 0472/663700 – Fax. 011/582961 – lassaut@telenet.be – IBAN BE 32 7512 0493 7802
Secretariaat : Singellaan, 16 A – 3545 HALEN – Tel. 0483/42.98.30 – Mail : bureel@asc-controle.be

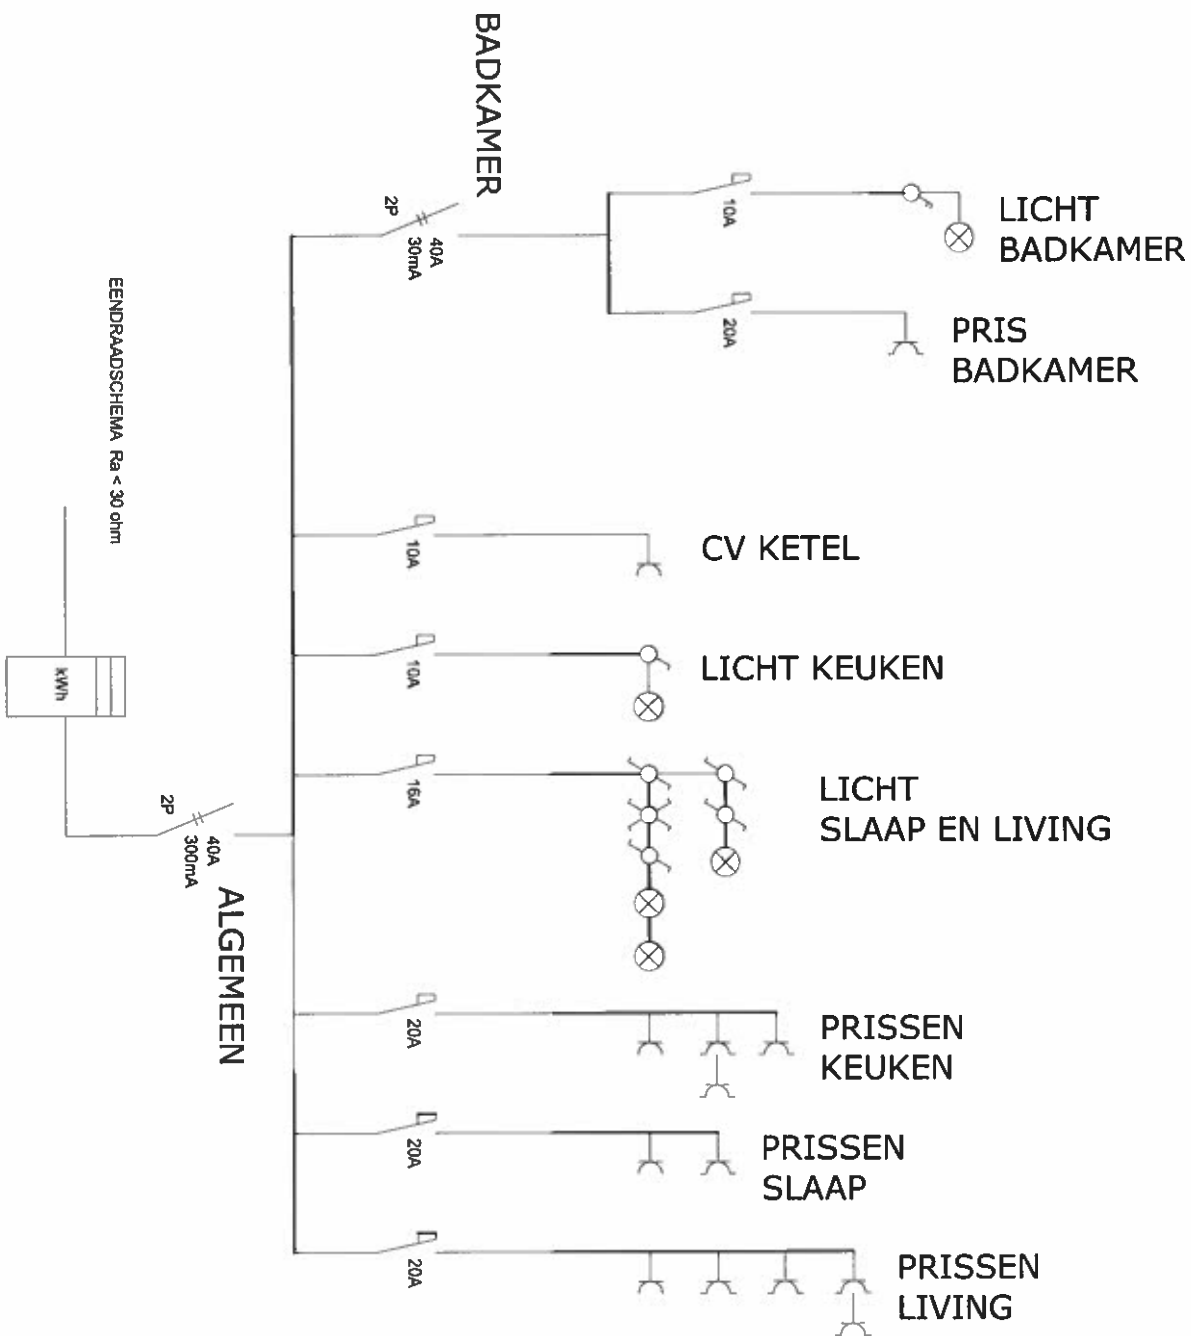

DE AANNEMER

DE ARCHITECT
Stijn Van Horenbeek
Strijdersstraat 66
3370 Boutersem

DE BOUWHEER
Fam. Struyven
Hoegaardenstraat 9
3300 Tienen

WUZIGINGEN

03/05/2016



DOSSIËR NR.

16.023

PAGINA

1/1

verdiep +2

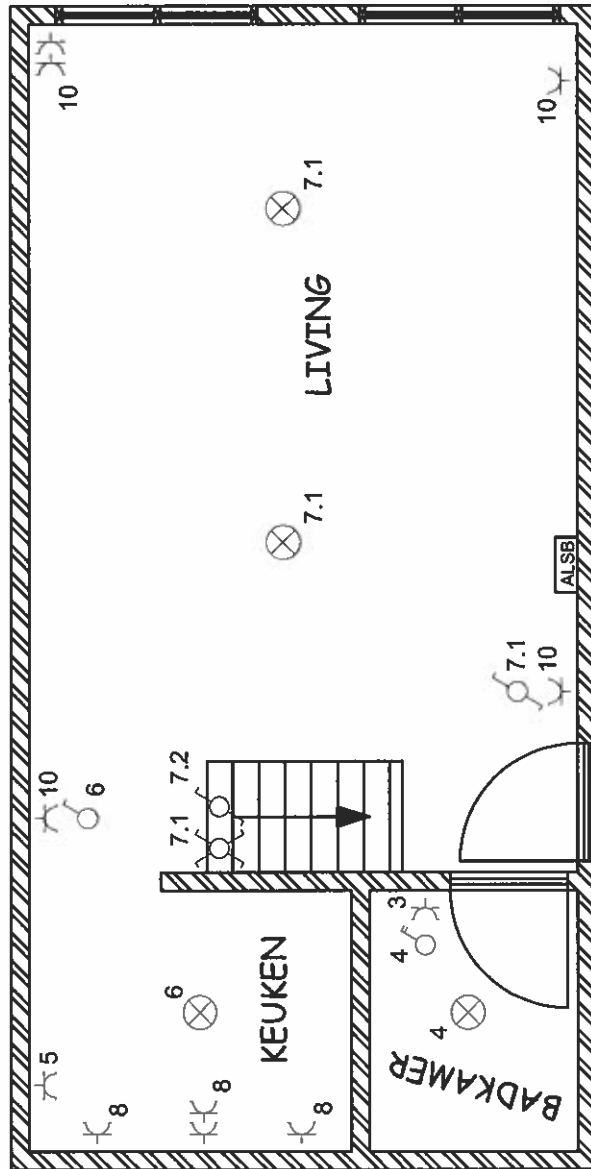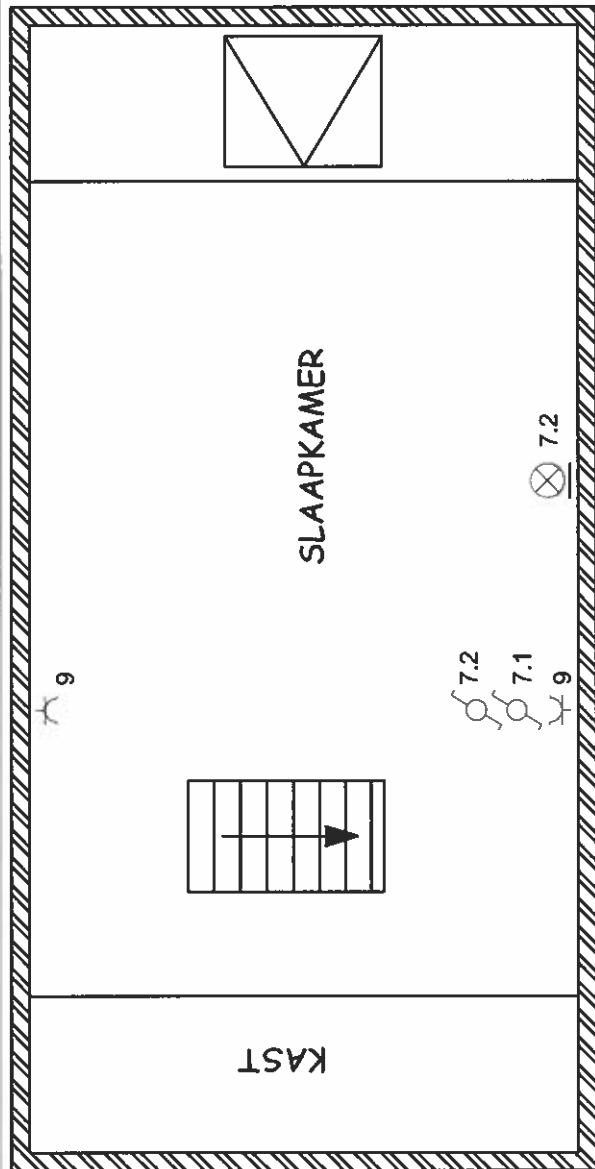

DE AANNEMER	DE ARCHITECT	DE BOUWHEER	WIJZIGINGEN	DOSSIER NR.	PAGINA
	Stijn Van Horenbeek Stijdersstraat 66 3370 Boutsom	Fam. Struyven Hoegaardenstraat 9 3300 Tienen	03/05/2016	16.023	1/1
			verdiep +2		
