

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/10/2024

Inspecteur: Yves Pelgrims

Mentor:

Installateur: BM ELECTRICS BVBA

ID-label: A 03

B.T.W. nr.: BE 0507 854 584

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251328

Datum verslag: 24/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Denijs Dillestraat
Huisnummer 86
Busnummer 003
Postcode 3200
Gemeente Aarschot
Land België

Eigenaar

Naam Evillas
Straatnaam Denijs Dillestraat
Huisnummer 86
Busnummer 003
Postcode 3200
Gemeente Aarschot
Land België

Installateur

Naam BM ELECTRICS BVBA
BTW nr. BE 0507 854 584
Telefoonnummer +32 498 61 45 90
E-mail info@bmelectrics.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: -

 Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Ja

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 19



Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 362 MΩ

RE: 2,41 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/10/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I. Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:33 tot 11:48
De inspecteur Yves Pelgrims

Handtekening: Yves Pelgrims
#3 - ACEG VZW

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaanisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



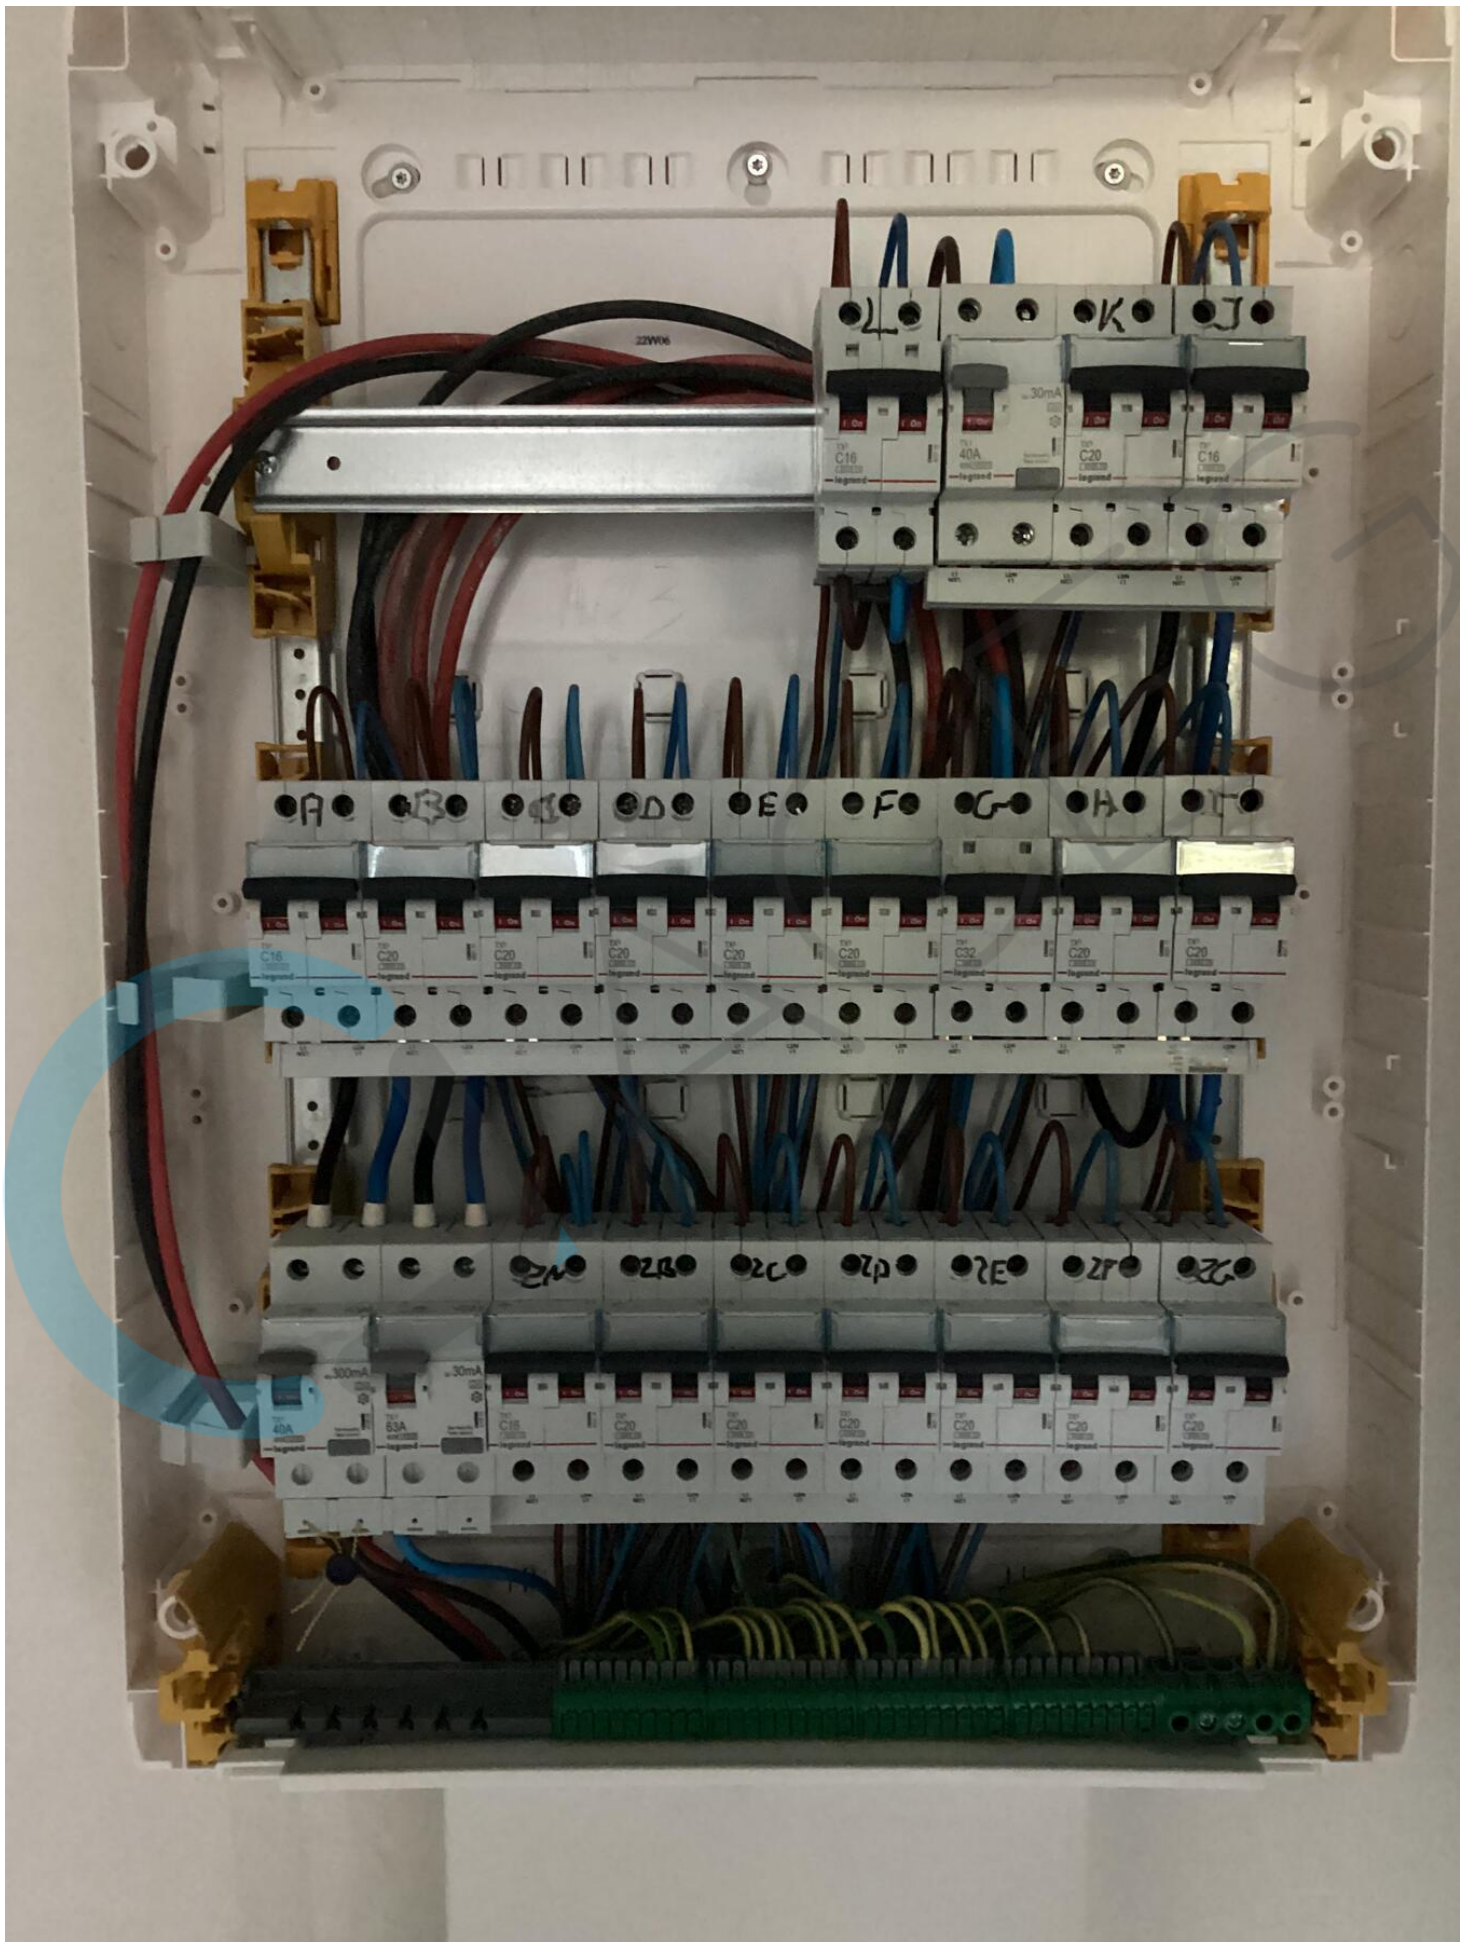

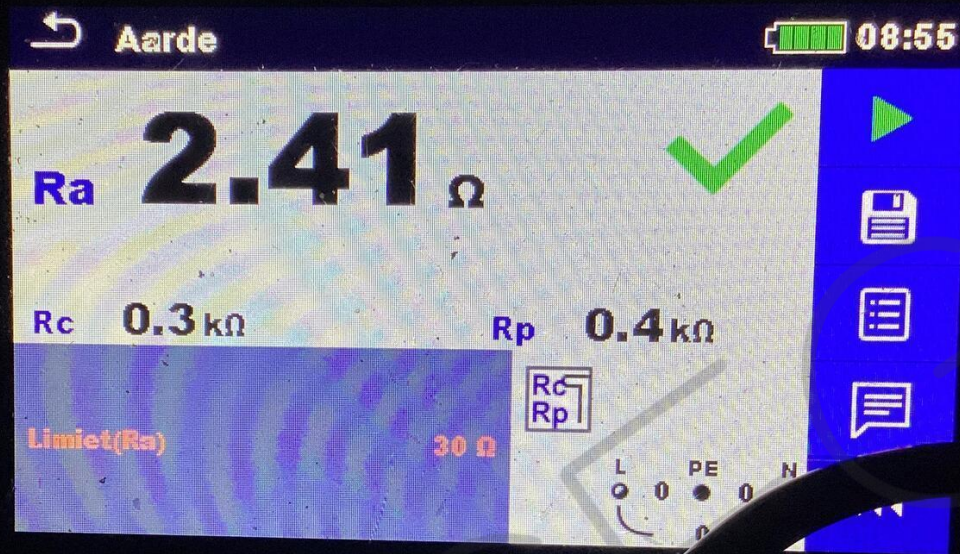




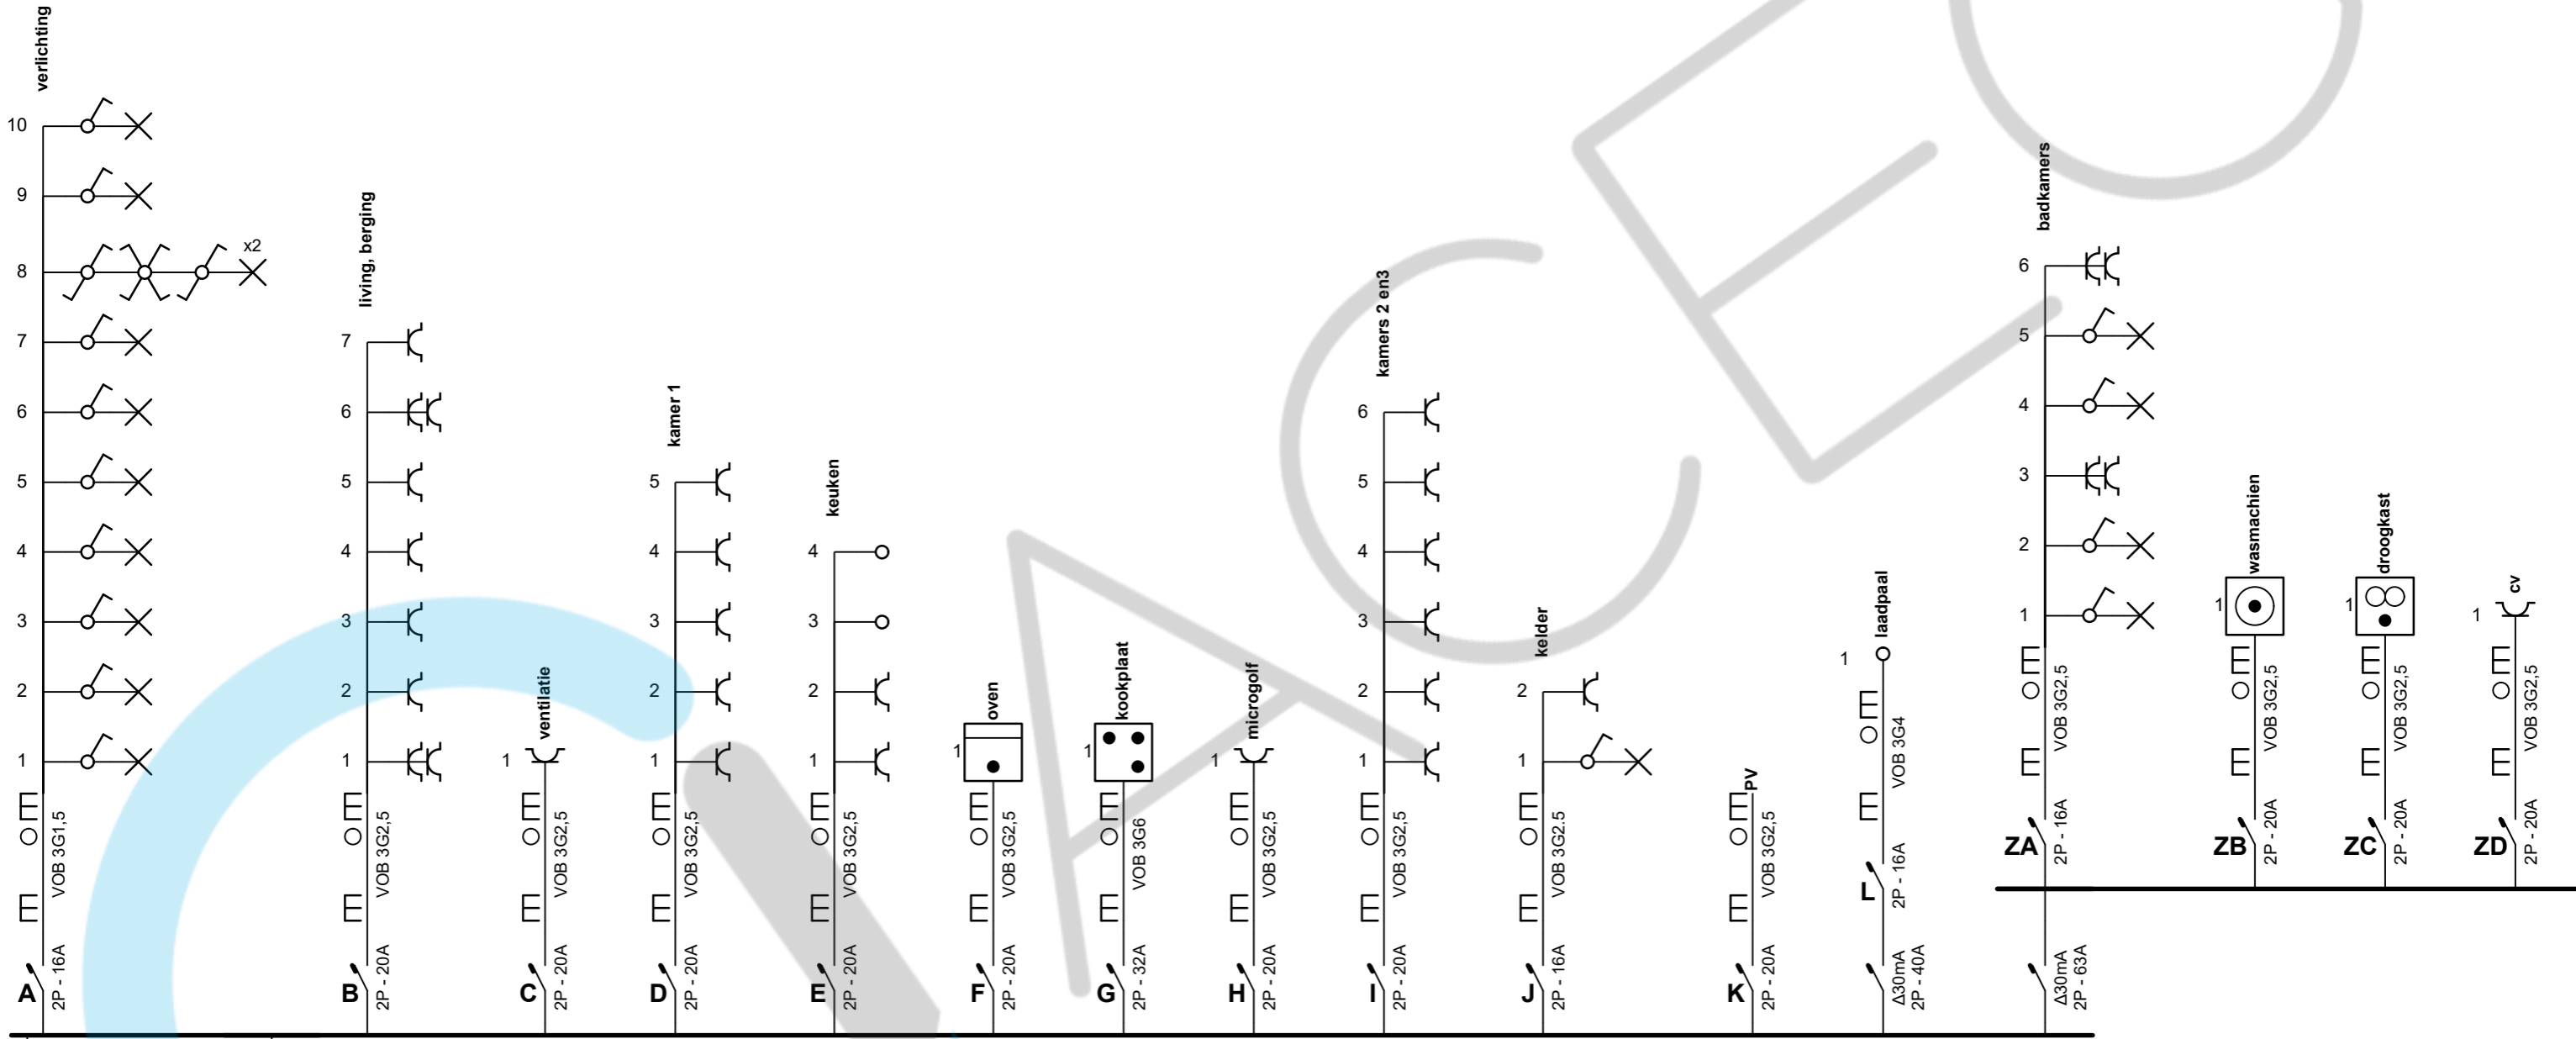

Handtekening: Yves Pelgrims
 #3 - ACEG VZW
 24/10/2024

Plaats van de elektrische installatie Evillas A03 Denijs Dillestraat 86 Bus 003 3200 Aarschot	Installateur BM electrics bv Heidestraat 149 1741 Ternat GSM: 0498 61 45 90 e-mail: bmelectrics@telenet.be BTW BE 0507.854.584	p. 1/4 Eendraadschema 1 x 400V + N ~ 50Hz
---	---	---



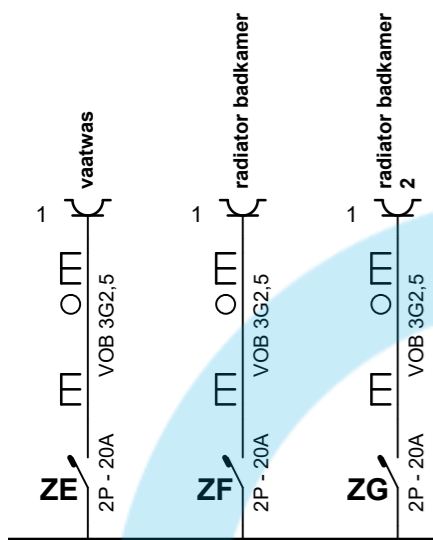


WAGNER

Handtekening: Yves Pelgrims
 #3 - ACEG VZW
 24/10/2024

Plaats van de elektrische installatie Evillas A03 Denijs Dillestraat 86 Bus 003 3200 Aarschot	Installateur BM electrics bv Heidestraat 149 1741 Ternat GSM: 0498 61 45 90 e-mail: bmelectrics@telenet.be BTW BE 0507.854.584	p. 2/4 Eendraadschema 1 x 400V + N ~ 50Hz
---	---	---



App A03

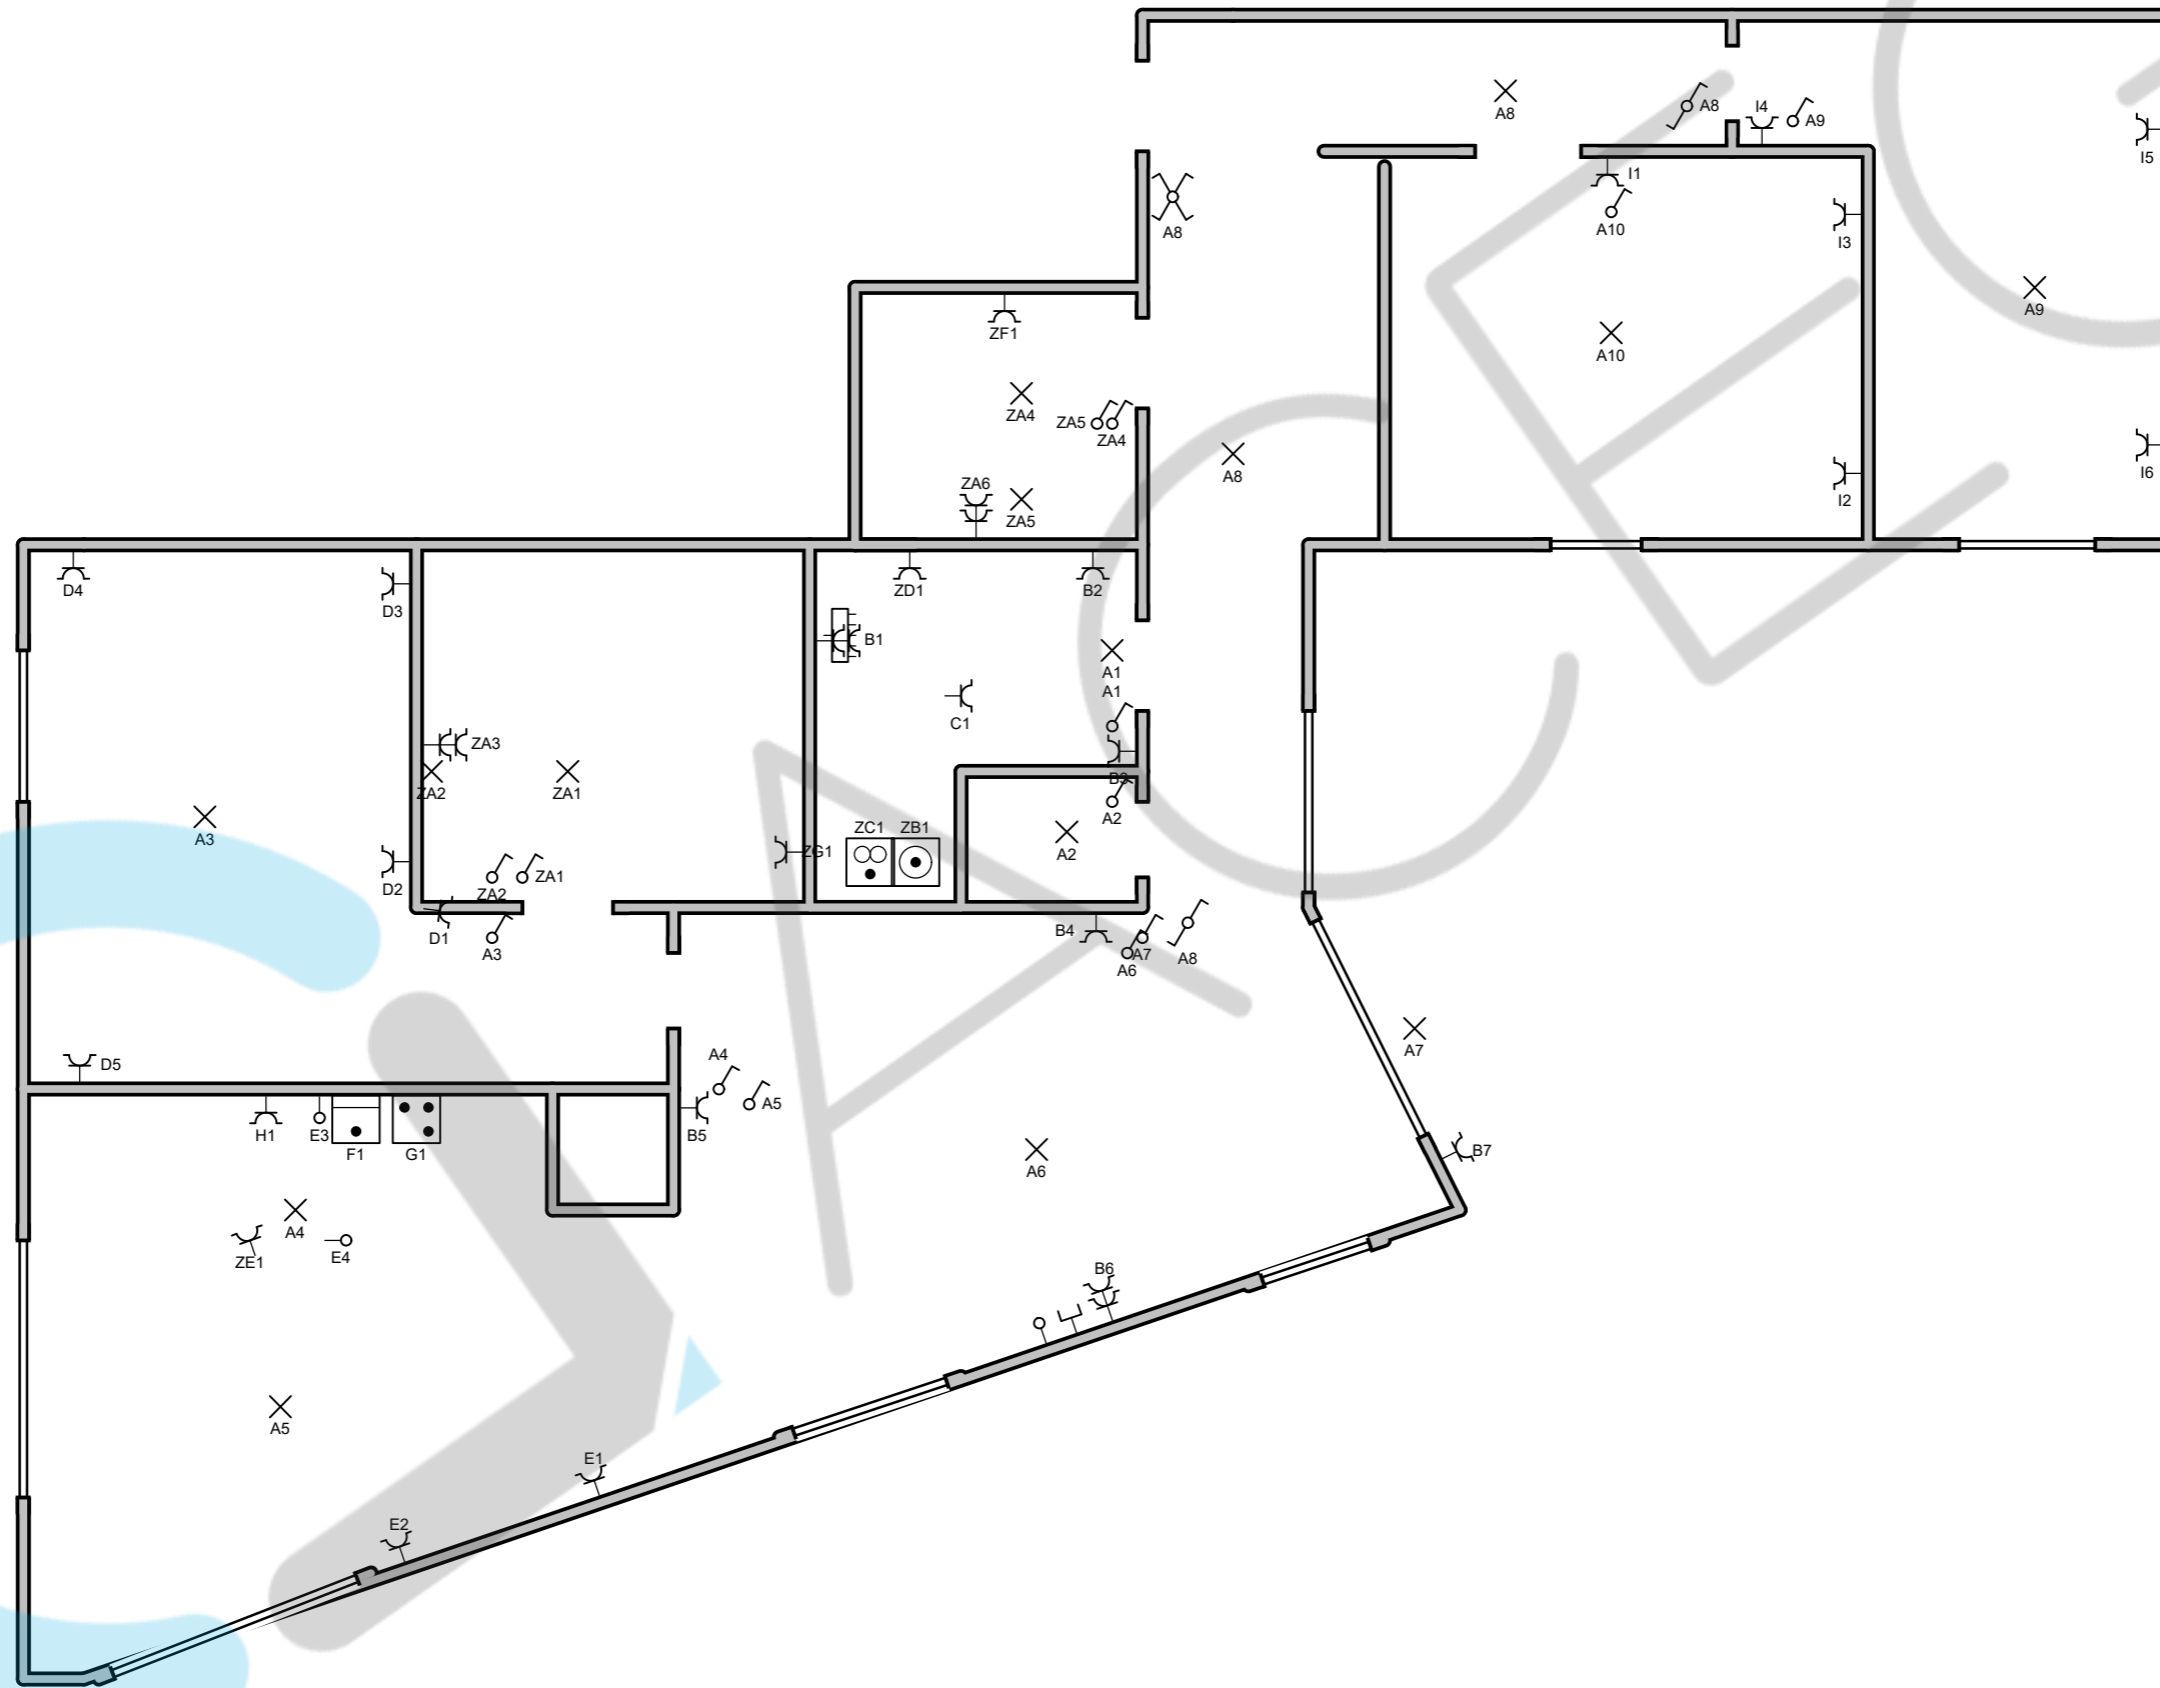

Yves Pelgrims
#3 - ACEG VZW
Handtekening: 
24/10/2024


Plaats van de elektrische installatie
Evillas A03
Denijs Dillestraat 86 Bus 003
3200 Aarschot

Installateur
BM electrics bv
Heidestraat 149
1741 Ternat
GSM: 0498 61 45 90
e-mail: bmelectrics@telenet.be
BTW BE 0507.854.584



p. 3/4
Situatieschema
1 x 400V + N ~ 50Hz

A	verlichting
B	living, berging
C	ventilatie
D	kamer 1
E	keuken
F	oven
G	kookplaat
H	microgolf
I	kamers 2 en3
J	kelder
K	PV
L	laadpaal
ZA	badkamers
ZB	wasmachien
ZC	droogkast
ZD	cv
ZE	vaatwas
ZF	radiator badkamer
ZG	radiator badkamer 2

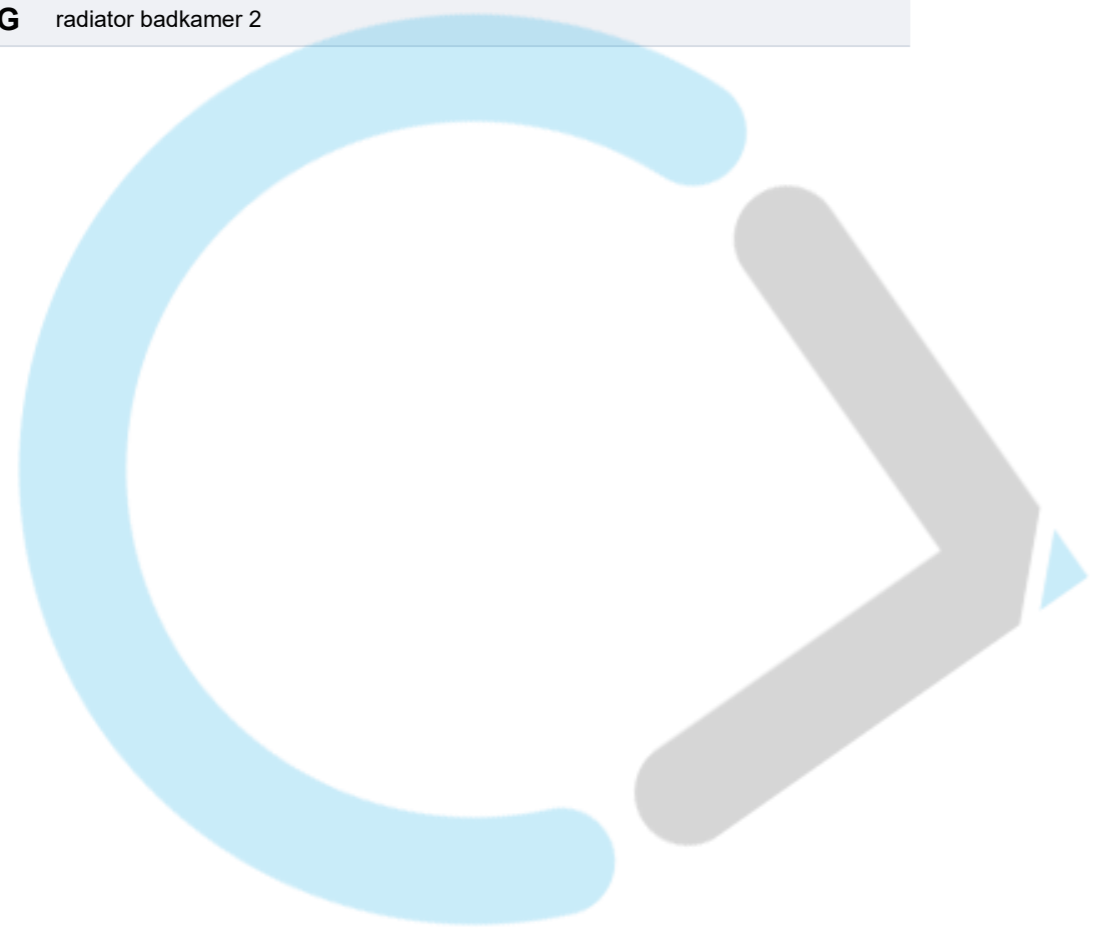

Handtekening: Yves Pelgrims
 #3 - ACEG VZW
 24/10/2024

Plaats van de elektrische installatie Evillas A03 Denijs Dillestraat 86 Bus 003 3200 Aarschot	Installateur BM electrics bv Heidestraat 149 1741 Ternat GSM: 0498 61 45 90 e-mail: bmelectrics@telenet.be BTW BE 0507.854.584	p. 4/4 Lijst Kringen 1 x 400V + N ~ 50Hz
---	---	--

