

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 30/10/2024

Inspecteur: Guy Boon

Mentor:

Installateur: E.I. Wim Vanderwaeren

ID-label:

B.T.W. nr. BE 0895 346 325

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23280773

Datum verslag: 30/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Waversbaan eigen installateur laten
staan

Huisnummer

141

Busnummer

Postcode

3001

Gemeente

Heverlee

Land

Belgie

Eigenaar

Naam

Grymonprez Ileen

Straatnaam

Waversbaan eigen installateur laten
staan

Huisnummer

141

Busnummer

Postcode

3001

Gemeente

Heverlee

Land

Belgie

Installateur

Naam

E.I. Wim Vanderwaeren

BTW nr.

BE 0895 346 325

Telefoonnummer

0498697214

E-mail


wvanderwaeren@yahoo.com

Type woning

EAN : 541448820060188395

Teller Nr.: 5214310

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

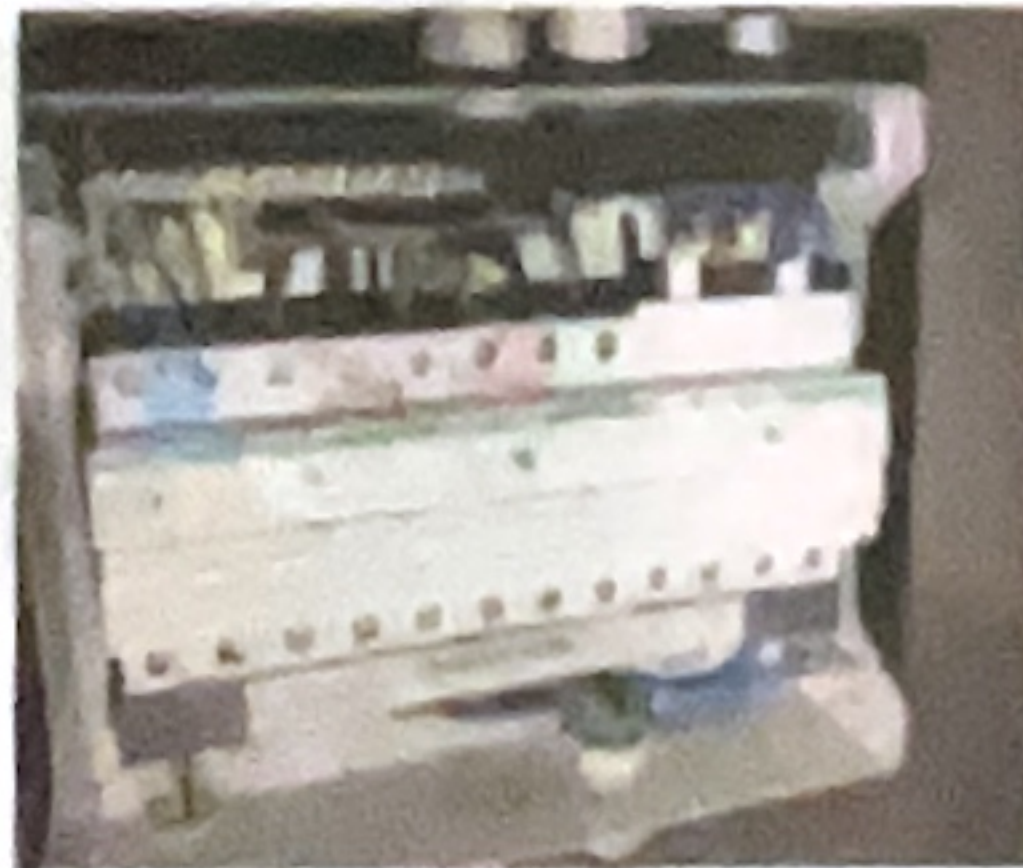

Aanpak onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Nefbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 5

Aantal kringen: 20

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 4,54 MΩ

RE: 30,0 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK
10	25		22.5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 30/10/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n).

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:09 tot 15:55

De inspecteur Guy Boon

Guy Boon

ACEG VZW - #197

Plichten van de eigenaar, beheerder, installateur voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden toegevoegd aan het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, tevens reeds of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0830.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 30/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen
